Envoyé en préfecture le 29/09/2025
Reçu en préfecture le 29/09/2025
Publié le
ID : 005-210500963-20250924-CM2025_080-DE

Planning travaux Palais des Sports Orcières-Merlette
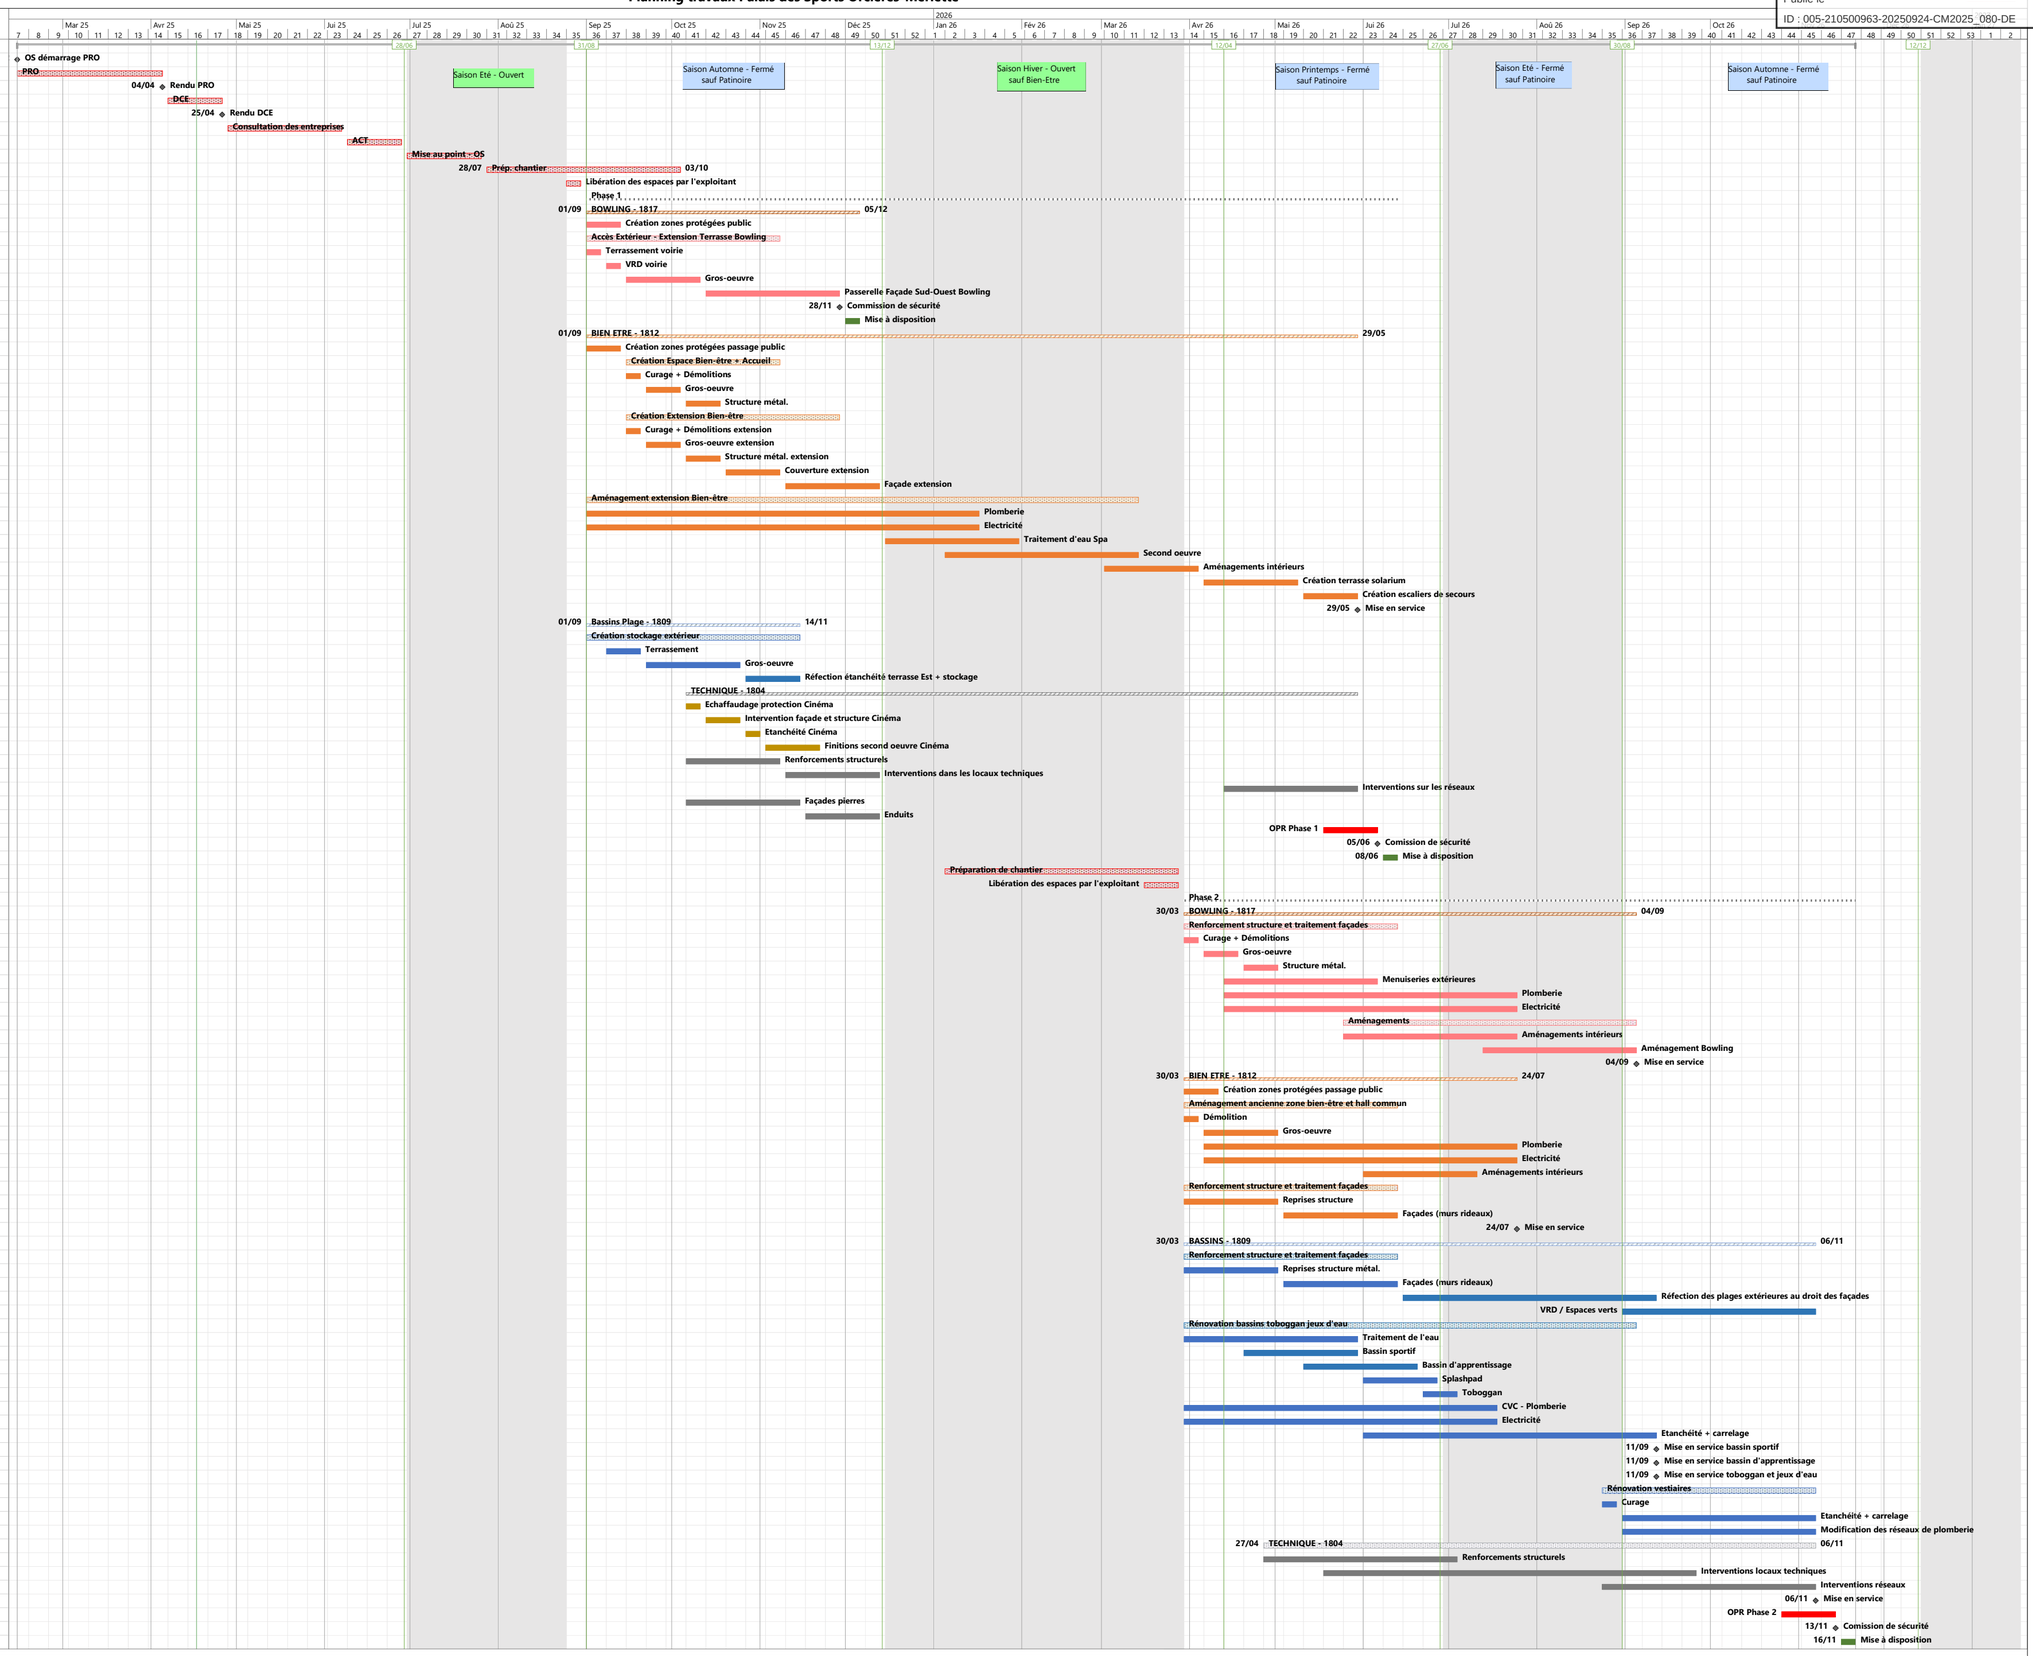
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0	**Orcières**	**422 jours**	**13/02/25**	**20/11/26**
1	OS démarrage PRO	0 jour	13/02/25	13/02/25
2	PRO	37 jours	13/02/25	04/04/25
3	Rendu PRO	0 jour	04/04/25	04/04/25
4	DCE	15 jours	07/04/25	25/04/25
5	Rendu DCE	0 jour	25/04/25	25/04/25
6	Consultation des entreprises	30 jours	28/04/25	06/06/25
7	ACT	15 jours	09/06/25	27/06/25
8	Mise au point - OS	20 jours	30/06/25	25/07/25
9	Prép. chantier	35 jours	28/07/25	03/10/25
10	Libération des espaces par l'exploitant	5 jours	25/08/25	29/08/25
11	**Phase 1**	**195 jours**	**01/09/25**	**12/06/26**
12	**BOWLING - 1817**	**70 jours**	**01/09/25**	**05/12/25**
13	Création zones protégées public	10 jours	01/09/25	12/09/25
14	Accès Extérieur - Extension Terrasse Bowling	50 jours	01/09/25	07/11/25
15	Terrassement voirie	5 jours	01/09/25	05/09/25
16	VRD voirie	5 jours	08/09/25	12/09/25
17	Gros-oeuvre	20 jours	15/09/25	10/10/25
18	Passerelle Façade Sud-Ouest Bowling	35 jours	13/10/25	28/11/25
19	Commission de sécurité	0 jour	28/11/25	28/11/25
20	Mise à disposition	5 jours	01/12/25	05/12/25
21	**BIEN ETRE - 1812**	**185 jours**	**01/09/25**	**29/05/26**
22	Création zones protégées passage public	10 jours	01/09/25	12/09/25
23	Création Espace Bien-être + Accueil	40 jours	15/09/25	07/11/25
24	Curage + Démolitions	5 jours	15/09/25	19/09/25
25	Gros-oeuvre	10 jours	22/09/25	03/10/25
26	Structure métal.	10 jours	06/10/25	17/10/25
27	Création Extension Bien-être	55 jours	15/09/25	28/11/25
28	Curage + Démolitions extension	5 jours	15/09/25	19/09/25
29	Gros-oeuvre extension	10 jours	22/09/25	03/10/25
30	Structure métal. extension	10 jours	06/10/25	17/10/25
31	Couverture extension	15 jours	20/10/25	07/11/25
32	Façade extension	25 jours	10/11/25	12/12/25
33	Aménagement extension Bien-être	130 jours	01/09/25	13/03/26
34	Plomberie	90 jours	01/09/25	16/01/26
35	Electricité	90 jours	01/09/25	16/01/26
36	Traitement d'eau Spa	25 jours	15/12/25	30/01/26
37	Second oeuvre	50 jours	05/01/26	13/03/26
38	Aménagements intérieurs	25 jours	02/03/26	03/04/26
39	Création terrasse solarium	25 jours	06/04/26	08/05/26
40	Création escaliers de secours	15 jours	11/05/26	29/05/26
41	Mise en service	0 jour	29/05/26	29/05/26
42	**Bassins Plage - 1809**	**55 jours**	**01/09/25**	**14/11/25**
43	Création stockage extérieur	55 jours	01/09/25	14/11/25
44	Terrassement	10 jours	08/09/25	19/09/25
45	Gros-oeuvre	25 jours	22/09/25	24/10/25
46	Réfection étanchéité terrasse Est + stockage	15 jours	27/10/25	14/11/25
47	**TECHNIQUE - 1804**	**160 jours**	**06/10/25**	**29/05/26**
48	Echaffaudage protection Cinéma	5 jours	06/10/25	10/10/25
49	Intervention façade et structure Cinéma	10 jours	13/10/25	24/10/25
50	Etanchéité Cinéma	5 jours	27/10/25	31/10/25
51	Finitions second oeuvre Cinéma	15 jours	03/11/25	21/11/25
52	Renforcements structurels	25 jours	06/10/25	07/11/25
53	Interventions dans les locaux techniques	25 jours	10/11/25	12/12/25
54	Interventions sur les réseaux	35 jours	13/04/26	29/05/26
55	Façades pierres	30 jours	06/10/25	14/11/25
56	Enduits	20 jours	17/11/25	12/12/25
57	**OPR Phase 1**	15 jours	18/05/26	05/06/26
58	**Comission de sécurité**	0 jour	05/06/26	05/06/26
59	**Mise à disposition**	5 jours	08/06/26	12/06/26
60	Préparation de chantier	60 jours	05/01/26	27/03/26
61	Libération des espaces par l'exploitant	10 jours	16/03/26	27/03/26
62	**Phase 2**	**155 jours**	**30/03/26**	**20/11/26**
63	**BOWLING - 1817**	**100 jours**	**30/03/26**	**04/09/26**
64	Renforcement structure et traitement façades	55 jours	30/03/26	12/06/26
65	Curage + Démolitions	5 jours	30/03/26	03/04/26
66	Gros-oeuvre	10 jours	06/04/26	17/04/26
67	Structure métal.	10 jours	20/04/26	01/05/26
68	Menuiseries extérieures	40 jours	13/04/26	05/06/26
69	Plomberie	75 jours	13/04/26	24/07/26
70	Electricité	75 jours	13/04/26	24/07/26
71	Aménagements	60 jours	25/05/26	04/09/26
72	Aménagements intérieurs	45 jours	25/05/26	24/07/26
73	Aménagement Bowling	25 jours	13/07/26	04/09/26
74	Mise en service	0 jour	04/09/26	04/09/26
75	**BIEN ETRE - 1812**	**85 jours**	**30/03/26**	**24/07/26**
76	Création zones protégées passage public	10 jours	30/03/26	10/04/26
77	Aménagement ancienne zone bien-être et hall commun	55 jours	30/03/26	12/06/26
78	Démolition	5 jours	30/03/26	03/04/26
79	Gros-oeuvre	20 jours	06/04/26	01/05/26
80	Plomberie	80 jours	06/04/26	24/07/26
81	Electricité	80 jours	06/04/26	24/07/26
82	Aménagements intérieurs	30 jours	01/06/26	10/07/26
83	Renforcement structure et traitement façades	55 jours	30/03/26	12/06/26
84	Reprises structure	25 jours	30/03/26	01/05/26
85	Façades (murs rideaux)	30 jours	04/05/26	12/06/26
86	Mise en service	0 jour	24/07/26	24/07/26
87	**BASSINS - 1809**	**145 jours**	**30/03/26**	**06/11/26**
88	Renforcement structure et traitement façades	55 jours	30/03/26	12/06/26
89	Reprises structure métal.	25 jours	30/03/26	01/05/26
90	Façades (murs rideaux)	30 jours	04/05/26	12/06/26
91	Réfection des plages extérieures au droit des façades	50 jours	15/06/26	11/09/26
92	VRD / Espaces verts	50 jours	31/08/26	06/11/26
93	Rénovation bassins toboggan jeux d'eau	100 jours	30/03/26	04/09/26
94	Traitement de l'eau	45 jours	30/03/26	29/05/26
95	Bassin sportif	30 jours	20/04/26	29/05/26
96	Bassin d'apprentissage	30 jours	11/05/26	19/06/26
97	Splashpad	20 jours	01/06/26	26/06/26
98	Toboggan	10 jours	22/06/26	03/07/26
99	CVC - Plomberie	80 jours	30/03/26	17/07/26
100	Electricité	80 jours	30/03/26	17/07/26
101	Etanchéité + carrelage	60 jours	01/06/26	11/09/26
102	Mise en service bassin sportif	0 jour	11/09/26	11/09/26
103	Mise en service bassin d'apprentissage	0 jour	11/09/26	11/09/26
104	Mise en service toboggan et jeux d'eau	0 jour	11/09/26	11/09/26
105	Rénovation vestiaires	55 jours	24/08/26	06/11/26
106	Curage	5 jours	24/08/26	28/08/26
107	Etanchéité + carrelage	50 jours	31/08/26	06/11/26
108	Modification des réseaux de plomberie	50 jours	31/08/26	06/11/26
109	**TECHNIQUE - 1804**	**125 jours**	**27/04/26**	**06/11/26**
110	Renforcements structurels	50 jours	27/04/26	03/07/26
111	Interventions locaux techniques	80 jours	18/05/26	25/09/26
112	Interventions réseaux	55 jours	24/08/26	06/11/26
113	Mise en service	0 jour	06/11/26	06/11/26
114	**OPR Phase 2**	15 jours	26/10/26	13/11/26
115	**Comission de sécurité**	0 jour	13/11/26	13/11/26
116	**Mise à disposition**	5 jours	16/11/26	20/11/26
